


- Baumontage - Bauelemente
- Verkehrssicherung Zufahrt West
- Rodungarbeiten, Baufeld freimachen
- Verlegung Rutenbocker Bach
- Einrichten Vortrieb Ost
- Sicherungarbeiten Parallelbereiche
- Vorfällige Entwasserung
- SAL Rutenbocker
- Unterführung Rutenbocker Bach
- Stufenmauer
- Betriebsgebäude west
- Strahlbau West

- Rodungarbeiten, Baufeld freimachen
- Baustelle einrichten
- Verdichtung Korzener Bachtal
- Stellenvortrieb Korzert
- Einrichten Vortrieb Ost - St 15
- Aushub, Bodenungsicherung - St 15
- Dammerschließung Korzert
- Stützwand Erneuerlich
- Überschüttung offene Bauweise
- Betriebsgebäude Ost
- Brücke Mühlenterrasse
- Strahlbau Ost

**VERTIKALISIERUNGSDATEN**  
 Baubeginn (01.01.02)  
 Holzschlag (28.02.02)  
 Freigabe Gelände Erneuerlich (31.03.02)  
 Abbruch Heus Korzert (03.05.02)  
 Fertigstellung SAL Rutenbocker (31.07.02)  
 Bauende (04.10.02) (20.08.05)

E	Überbearbeitung	17.10.03	Balbi/Friese
D	IST-Termine	24.03.03	Balbi
C	Hinterlegung Amtsvorschlag	11.12.02	Balbi
B	Verlängerung Bergmännischer Vortrieb Ost	28.10.02	Balbi
A	Vertragstermine nachgetragen	22.05.02	Schl.
Index	Änderung	Datum	Name

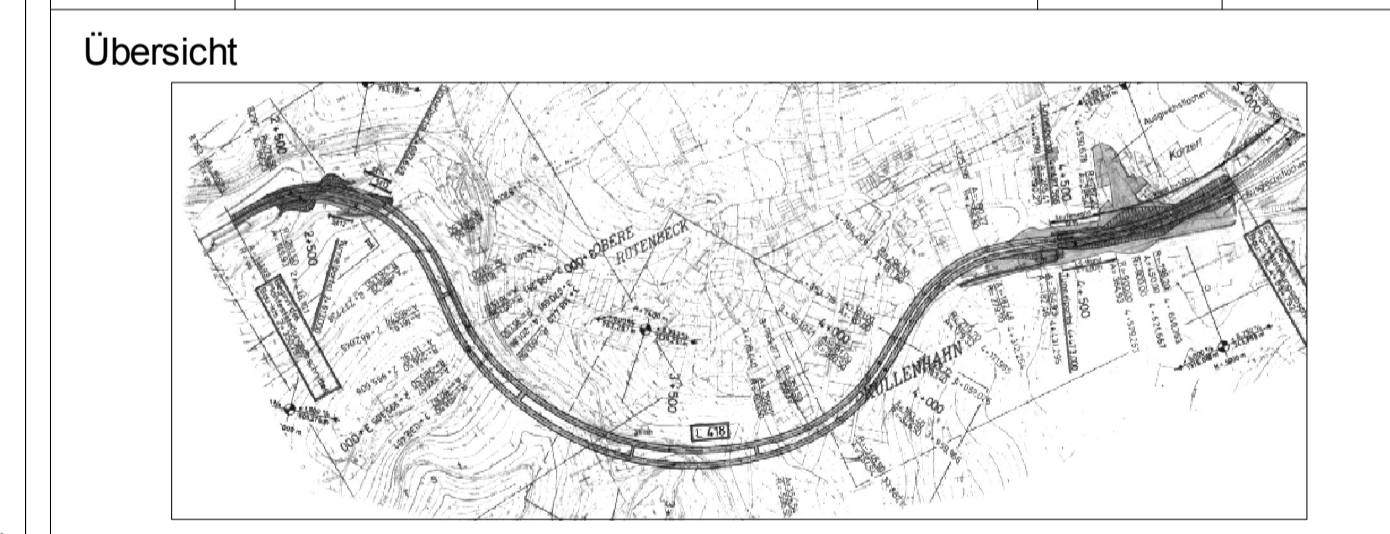

DER DIREKTOR DES LANDESBETRIEBES STRASSENBAU NRW  
 NIEDERLASSUNG ESSEN

### AUSFÜHRUNGSZEICHNUNG

Für die Richtigkeit der Ausführungsunterlagen verantwortlich:				Blatt-Nr.	Bauwerk	Art	Nr.	Ind.
Ingenieurbüro	ITB	Baufirma	ATB	MITT	10	001	D	
Ingenieurgesellschaft Tunnel Burgholz				Projekt-IB-Wend	Maßstab			
				Nr.	1:5000			
				Datum	Name			
				bezt.	12.01.02	Mj/Fr		
				gez.	12.01.02	Fr		
				gepr.				

Sachverhalt: Tunnel Burgholz  
 Bauwerk:  
 Oben/Unten: Landesstraße L 418  
 dargestellt: **BAUZEITENPLAN** Bauw.-Nr. (ASB)

Brückenkl. (DIN 1072) = 60/30 MLC = 100/50-50  
 Stempel des Ingenieurs  
 Zur Bauausführung freigegeben:  
 Niederlassung Essen  
 Essen,  
 im Auftrag  
 Die Darstellung stimmt mit der Ausführung überein  
 Niederlassung Essen  
 Essen,  
 im Auftrag

**Innenausbau 9 Monate**  
**Betriebstechnische Ausstattung**  
**Verkehrsleiteinrichtung**

**Restarbeiten 3 Monate - Gesamtabnahme: 44 Monate**
